

11/10/21

MOD. 304

Perugia, data protocollo

MODULARIO  
B.C. - 255



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Segretariato Regionale del MIBAC  
per l'Umbria  
Piazza IV Novembre, 36  
06123 – PERUGIA (PG)

34.16.10/59

Prot. n.

Allegati

MIBAC-SABAP-UMB  
AOT  
0013083 08/07/2019  
Cl. 34.16.10/59

OGGETTO: DM 19/02/2018 Rimodulazione degli interventi finanziati con la legge n.232/2016 art.1 c.140 – Anni 2017-2022.  
ORVIETO (TR) DUOMO. Riduzione della vulnerabilità e restauro  
Importo complessivo anno 2018-2019 € 750 – CAP 8105/4  
CUP F43G18000060001  
CIG Z2C27BFCD0  
**Intervento di somma urgenza per la cerchiatura dei pilastri della navata**

In allegato alla presente si trasmette, per il seguito di competenza, la seguente documentazione:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori (in bollo);
- Sal 1° e Finale, Certificato di Pagamento (in bollo);
- Registro di Contabilità;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di regolare Esecuzione (in Bollo);
- Libretto delle Misure n. 1
- Avvisi ai Creditori;
- Dichiarazione sulla Cessione dei Crediti.

Si rappresenta inoltre che il sottoscritto RUP, con annotazione nel Certificato di Regolare Esecuzione e detrazione nel Certificato di Pagamento, ha disposto l'applicazione della penale per ritardo nel termine finale di esecuzione dei lavori. Rimane salva la potestà della Stazione Appaltante della determinazione sulla effettiva applicazione della penale.

Il RUP

Arch. Maurizio DAMIANI

Visto: IL SOPRINTENDENTE  
dott.ssa Marica MERCALLI

MD/





**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**  
 Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

PROGRAMMA	D.M. APPROVAZIONE	ESERCIZIO FIN.	CAPITOLO	NR.	IMPORTO €
TRIENNALE 2017 - 2022	19/02/18	2018/19	8105/4		750000
LOCALITA'	ORVIETO (TR)				
IMMOBILE	DUOMO				
LAVORI DI	RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E RESTAURO Intervento per la cerchiatura dei pilastri della navata				
PERIZIA	n. 07/19 del 21/03/2019 Approvata con D.S. del 21/03/2019				
C.U.P. - GIG	CUP F43G18000060001 - CIG Z2C27BFCD0				

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno in Orvieto (TR), il sottoscritto Ing. Giuseppe Lacava direttore dei lavori in oggetto:

VISTO il verbale di somma urgenza del 15.03.2019 con il quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta Birtognolo Moreno, specializzata nella esecuzione di manufatti speciali in acciaio, con sede in Via dei Falegnami snc - 05018 Orvieto (TR), P.IVA 00782120554 num. REA TR 82831

VISTA la perizia di spesa n. 07/19 del 21/03/2019, per l'ammontare complessivo di €. 37.968,00;

CONSIDERATO che dagli accertamenti effettuati risulta che i lavori relativi all'Intervento di somma urgenza per la cerchiatura dei pilastri della navata del Duomo di Orvieto sono effettivamente ultimati;

VISTO l'art. 199 del Regolamento Generale sulle OO.PP., approvato con D.P.R. N° 207/2010;

VISTO l'art. 12 c. 1 del D.M. N° 49/2018;

**Certifica**

che i lavori in oggetto sono ultimati.

Considerato che nel verbale di consegna veniva assegnato per l'ultimazione dei lavori un termine di 90 giorni naturali e consecutivi, per cui la stessa doveva avvenire entro il 19 giugno 2019, tenuto conto che gli stessi sono stati ultimati in data 19 giugno 2019, dunque con un ritardo di n. <sup>2</sup> giorni rispetto al tempo utile.

Atto redatto in triplice esemplare, di cui uno in bollo, firmato dalle parti.

Orvieto, li 21/06/19

PER ACCETTAZIONE  
La ditta

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Giuseppe Lacava

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
arch. Maurizio Damiani





**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
 Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA**

**LAVORO:** Orvieto (TR) - Duomo - Riduzione della vulnerabilità sismica e restauro  
**Intervento per la cerchiatura dei pilastri della navata**



**CREDITORE:** Ditta Biritognolo Moreno  
 con sede in via dei Falegnami, snc, Orvieto (TR)

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N		1° e Finale	eseguiti a tutto il		19/06/19
STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI		
N	Data	Importo	Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:		
			1) per lavori eseguiti e somministrazioni fatte a lordo.....	€	33.900,00
			2) per quota materiali in cantiere.....	€	
			3) per anticipazioni.....	€	
					33.900,00
			RIMANE L'AMMONTARE LORDO DI .....		€ 33.900,00
			<i>Detrazioni:</i>		
			Per oneri relativi alla mano d'opera .....	€	-
			Per costi e oneri sicurezza non soggetti a ribasso .....	€	1.929,49
			totale non soggetto a ribasso .....	€	1.929,49
			1) per ribasso sui lavori eseguiti pari al..... 1,50%	€	479,56
			(pari a 33.900,00 - 1.929,49 = 31.970,51)		
			2) per penali € 33,90 x gg 7	€	237,30
			3) per infortuni D.P.R. 1063/62 (73.658,84-12.361,93) 0,50%	€	
<b>TOTALE €</b>		-			
<i>Annotazioni:</i>			TOTALE delle ritenute .....	€	716,86
			RIMANE L'AMMONTARE NETTO DI .....	€	33.183,14
			DEDOTTI I PRECEDENTI ACCONTI .....	€	-
			RIMANE IL CREDITO DELL'IMPRESA DI .....	€	<b>33.183,14</b>
			I.V.A. 10% .....	€	3.318,31
			<b>TOTALE .....</b>	€	<b>36.501,46</b>

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 e Finale**

INCARICO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ *Si certifica che ai termini del contratto si può pagare*  
 Verbale di somma urgenza e di consegna sotto riserva di legge del 15/03/2019 *all'Impresa la somma di € 36.501,46*  
 (diconsi Euro trentaseimilacinquecentounovirgolaquarantasei)  
 Importo Lavori Euro 33.900,00 (di cui 1.929,49 per oneri non soggetti a ribasso)  
 PERIZIA N. 07/2019 del 21/03/2019  
 Approvata con D.S. del 21/03/2019 Perugia li .....  
 VISTO:



n.ordine	Articolo d'elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO Unitario	IMPORTO
1	AP 01	Fornitura e posa in opera di n. 10 cerchiature in acciaio da realizzare nei pilastri circolari n. 2, 8 e 9 del Duomo come quelli già esistenti ed a similitudine dell'antico; il lavoro sarà comprensivo di ponteggio provvisorio per la realizzazione delle sagome e ponteggio fisso per la prova dei pezzi e per la posa finale, recinzione dell'area di cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Il ferro per i tiranti sarà forgiato e trattato con cera idonea.	cad	10,00	1 950,00	19 500,00
2	AP 2	Fornitura e posa in opera di n. 6 cerchiature in acciaio da realizzare in pilastro sagomato (pilastro n. 11) del Duomo; il lavoro sarà comprensivo di ponteggio provvisorio per la realizzazione delle sagome e ponteggio fisso per la prova dei pezzi e per la posa finale, recinzione dell'area di cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, il tutto secondo il disegno che sarà fornito dalla D.L.. Il ferro per i tiranti sarà forgiato e trattato con cera idonea.	cad	6,00	2 400,00	14 400,00
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 33 900,00</b>
<p>ORVIETO Perugia li 21/06/19</p>						
<p><b>L'IMPRESA</b> (Biritognolo Moreno)</p>			<p><b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b> (Ing. Giuseppe Lacava)</p> 			
			<p><b>IL R.U.P.</b> (Arch. Maurizio Damiani)</p> 			
<p><b>BIRITOGNOLO MORENO</b> Via de' Falegnami snc 05018 ORVIETO (TR) P.I. 0078212055 C.F. BRTMRF65S11G148W</p>						





**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**  
 Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

PROGRAMMA	D.M. APPROVAZIONE	ESERCIZIO FIN.	CAPITOLO	NR.	IMPORTO €
L. 132/16 art.1.c.140 (2017 - 2022)	19/02/18	2018/19	8105/4		750.000,00
<b>LOCALITA'</b>	ORVIETO (TR)				
<b>IMMOBILE</b>	DUOMO				
<b>LAVORI DI</b>	RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E RESTAURO <b>Intervento per la cerchiatura dei pilastri della navata</b>				
<b>PERIZIA</b>	N. 07/2019 del 21/03/2019				
<b>IMPRESA</b>	BIRITOGNOLO MORENO con sede in via dei Falegnami snc – Orvieto (TR)				
<b>CONTRATTO</b>	Verbale di Somma Urgenza e di Consegna sotto riserva di legge del 15/03/2019				
<b>IMPORTO</b>	€ 33.900,00				

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**  
 (art. 200 comma 2, DPR 207/2010)

**Perizia di spesa e Progetto principale:**

La perizia di spesa recante il n. 07/19 e la data del 21/03/2019, approvata con Decreto del Soprintendente in pari data, è stata redatta dal progettista ing. Giuseppe Lacava, per l'importo complessivo di € 37.968,00 così ripartito:

A1)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
	A MISURA	€ 33.900,00
	A CORPO	€
	IN ECONOMIA	€
	Sommano	€ 33.900,00
A2)	IMPORTO ONERI SICUREZZA (compreso in A1)	€ 1.929,49
A3)	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA a MISURA	€
<b>A)</b>	<b>Sommano lavori (A1+A3)</b>	<b>€ 33.900,00</b>
	<b>di cui non soggetti a ribasso (A2+A3)</b>	<b>€ 1.929,00</b>

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NEL PROGETTO ED ESCLUSI DALLA GARA	€
B2	RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI:	€
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€
B4	IMPREVISTI	€
B5	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	€
B6	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 133, COMMA 4, D. LGS. 163/2006	€
B7 a	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI DEI	€

	DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE		
B7 b	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE	€	
B7 c	SPESE TECNICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	€	
B7 d	SPESE TECNICHE RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€	
B7 e	SPESE TECNICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'	€.	
B7 f	SPESE TECNICHE RELATIVE ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 C. 5 DEL D.LGS 163/2006	€.	678,00
B8	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP, DI VERIFICA E VALIDAZIONE	€	
B9	SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI	€	
B1 0	SPESE PER LA PUBBLICITÀ E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE	€	
B1 1	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ECC,	€	
B1 2	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	€.	3.390,00
	Arrotondamento	€.	
<b>B )</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€.	<b>4.068,00</b>
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>37.968,00</b>

#### Fonti finanziarie della perizia:

La presente perizia di spesa è stata finanziata con D.M. 19/02/2018 – Rimodulazione degli interventi finanziati con la legge n. 232/2016 art.1, c. 140 – anni 2017 – 2022. Orvieto (TR) - Duomo. Riduzione della vulnerabilità e restauro – Importo complessivo anni 2018 - 2019 - Cap 8105/4.

#### Assuntore dei lavori:

I lavori in oggetto, sono stati affidati, ai sensi del c. 1 dell'art. 23 del DM 154/2017, del comma 7 dell'art. 148 e comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, mediante verbale di somma urgenza e di consegna sotto riserva di legge del 15/03/2019, alla ditta Biritognolo Moreno con sede in Orvieto (TR), via dei Falegnami snc, per l'importo di € **33.420,44** a seguito del ribasso del 1,50% sull'importo di €. 31.970,51 ottenuto sottraendo a l'importo a base d'asta di € 33.900,00 la cifra di € 1.929,49 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori:

Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'arch. Maurizio Damiani, quelle del Direttore dei Lavori dall'ing. Giuseppe Lacava, con la collaborazione del Geom. Marcello Caricchi in qualità di Direttore Operativo e del geom. Andrea Taddei in qualità di Assistente Tecnico

#### Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 15/03/2019, con il succitato verbale somma urgenza e di consegna sotto riserva di legge, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

#### Tempo utile per la esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori venne stabilita nello stesso verbale di consegna, la durata di 90 giorni naturali consecutivi. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 12/06/2019.

#### Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 21/06/2019 dichiarava ultimati in data 19/06/2019 con un ritardo di n. 3 giorni rispetto al tempo utile.

**Danni di forza maggiore:**

durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**Anticipazione in denaro:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse anticipazioni in denaro.

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni del progetto.

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 21/06/2019 e riporta le seguenti annotazioni:

A	Importo lordo dei lavori eseguiti	€.	33.900,00
B	di cui per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.929,49
C	A dedurre il ribasso d'asta del 1,50% (su € 31.970,51)	€.	479,56
D	Restano	€.	33.420,44
E	Importo acconti corrisposti all'impresa	€.	
F	Penali applicate / premio accelerazione	€.	0,00
G	Resta il credito dell'impresa (D-E+/-F)	€.	33.420,44

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

Importo netto autorizzato per lavori €. 33.420,44

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 33.420,44

**Infortuni in corso di lavoro:**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:**

la stazione appaltante provvederà ad acquisire il relativo D.U.R.C. degli Enti previdenziali di attestazione della regolarità contributiva dell'impresa per lavori eseguiti, prima di procedere alla liquidazione.

**Avvisi ai creditori:**

come da apposita certificazione del responsabile del procedimento Arch. Maurizio Damiani in data 21/06/2019 per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà in modo permanente, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del responsabile del procedimento Arch. Maurizio Damiani in data 21/06/2019

**Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.


**Tempo stabilito per il certificato di regolare esecuzione:**

In base all'art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/2006 e smi il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, e pertanto entro il 09/09/2019;

La presente relazione di accompagnamento al conto finale è redatta in doppio esemplare di cui uno sarà inviato al responsabile del procedimento.

Perugia li 21/06/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
ing. Giuseppe Lacaya





**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**  
 Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

PROGRAMMA	D.M. APPROVAZIONE	ESERCIZIO FIN.	CAPITOLO	NR.	IMPORTO €
L. 132/16 art.1.c.140 (2017 - 2022)	19/02/18	2018/19	8105/4		750.000,00
<b>LOCALITA'</b>	ORVIETO (TR)				
<b>IMMOBILE</b>	DUOMO				
<b>LAVORI DI</b>	RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E RESTAURO <b>Intervento per la cerchiatura dei pilastri della navata</b>				
<b>PERIZIA</b>	N. 07/2019 del 21/03/2019				
<b>IMPRESA</b>	BIRITOGNOLO MORENO con sede in via dei Falegnami snc – Orvieto (TR)				
<b>CONTRATTO</b>	Verbale di Somma Urgenza e di Consegna sotto riserva di legge del 15/03/2019				
<b>IMPORTO</b>	€. 33.900,00				

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102, comma 2 d.lgs. 50/2016 )

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 21 GIUGNO 2019 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- Sig. Moreno Biritognolo - (Rappresentante Legale della Ditta esecutrice)

**Descrizione dei lavori eseguiti:**

i presenti lavori di restauro sono consistiti in:

- Fornitura e posa in opera di n. 10 cerchiature in acciaio nei pilastri circolari n. 2, 8 e 9 del Duomo come quelli già esistenti ed a similitudine dell'antico, comprensivo di ponteggio provvisorio per la realizzazione delle sagome e ponteggio fisso per la prova dei pezzi e per la posa finale, ferro forgiato e trattato con cera idonea, recinzione dell'area di cantiere.
- Fornitura e posa in opera di n. 6 cerchiature in acciaio su pilastro sagomato (pilastro n. 11) del Duomo, comprensivo di ponteggio provvisorio per la realizzazione delle sagome e ponteggio fisso per la prova dei pezzi e per la posa finale, recinzione dell'area di cantiere, ferro forgiato e trattato con cera idonea.

**Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto, della perizia di spesa e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi:

- controllo e verifiche numeriche e qualitative delle cerchiature realizzate;

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni significative, fatte salve le modifiche dettate entro i poteri discrezionali della Direzione Lavori.

**Penale per il ritardo:**

Come risulta dalla relazione sul conto finale, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale;

**Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni dettate; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto contenuto nella relazione sul conto finale redatta in data 21/06/2019 e quanto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 33.420,44 è pari all'importo netto di cui verbale di somma urgenza e di consegna sotto riserva di legge del 15/03/2019;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti con un ritardo di n. 6 giorni rispetto al tempo utile stabilito dal verbale di consegna dei lavori;
- l) che i prezzi applicati sono quelli indicati nell'elenco prezzi e nella perizia di spesa allegati;

- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa ne procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- n) che, come risulta dagli atti, non è stato necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'incarico ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di: intervento per la cerchiatura dei pilastri della navata del Duomo di Orvieto (TR) , eseguiti dalla Ditta Biritognolo Moreno con sede in Orvieto (TR), via dei Falegnami snc, in base all'affidamento avvenuto con lettera di incarico prot. n. 11358 del 07/06/2016; sono stati regolarmente eseguiti e conferma il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 33.900,00
A dedurre ribasso d'asta del 1,50% su € 31.970,51	€ 479,56
Per acconti corrisposti	
Resta il credito dell'impresa in nette	€ 33.420,44


Resta il credito dell'Impresa in nette € 33.420,44 più € 3.342,04 per oneri IVA, per un totale di € 36.762,49 (euro trentasemilaquattrocentoventi virgola quarantaquattro) che saranno corrisposte all'Impresa Biritognolo Moreno con sede in Orvieto (TR), via dei Falegnami snc, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, previa attestazione della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa.

Orvieto, li 21/06/19

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giuseppe Lacava



L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maurizio Damiani




**BIRITOGNOLO MORENO**

Via dei Falegnami snc

05018 - ORVIETO (TR)

P.I. 00782120554 C.F. BRDMRNG6611G148W



CONSIDERATO IL RITARDO di 7 giorni NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SI DISPONE L'APPLICAZIONE DELLA PENALE PARI ~~ATA~~ all'1% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, COSI' CALCOLATA

$$€ 33.900,00 \times 1\% \times 7gg = € 237,30$$

IL RUP  
ME fanda

BIRTONOLO MORENO  
Via dei Pellegrini, 6/10  
00016 - ROMA (IT)  
Tel. 06/47811111

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
SEGRETARIATO REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELL'UMBRIA

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA**  
**PERUGIA**

**proprietà:** non statale

**Comune di:** Orvieto

**Provincia di:** Terni

**Lavori di:** DUOMO - Riduzione della vulnerabilità e restauro - Intervento per la cerchiatura dei pilastri della navata;

**PERIZIA PRINCIPALE N. 07/19 del 21/03/2019;**

**Verbale somma urgenza e consegna sotto riserva di legge del 15/03/2019;**

# **LIBRETTO DELLE MISURE n° 1**

(pagine n° 1)

Consegnato in bianco al Geom. *Andrea Taddei*


Addi 15/03/2019

Restituito all'Ufficio il 19/06/2019

**Il Direttore dei Lavori**  
(Ing. Giuseppe Lacava)





**Il Direttore dei Lavori**  
(Ing. Giuseppe Lacava)



Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Arch. Maurizio Damiani)









STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
SIRIO GHIOTTO MORENO  
Via del Falgout 100  
05018 - ORVIETO (TR)

# COLONNA 2

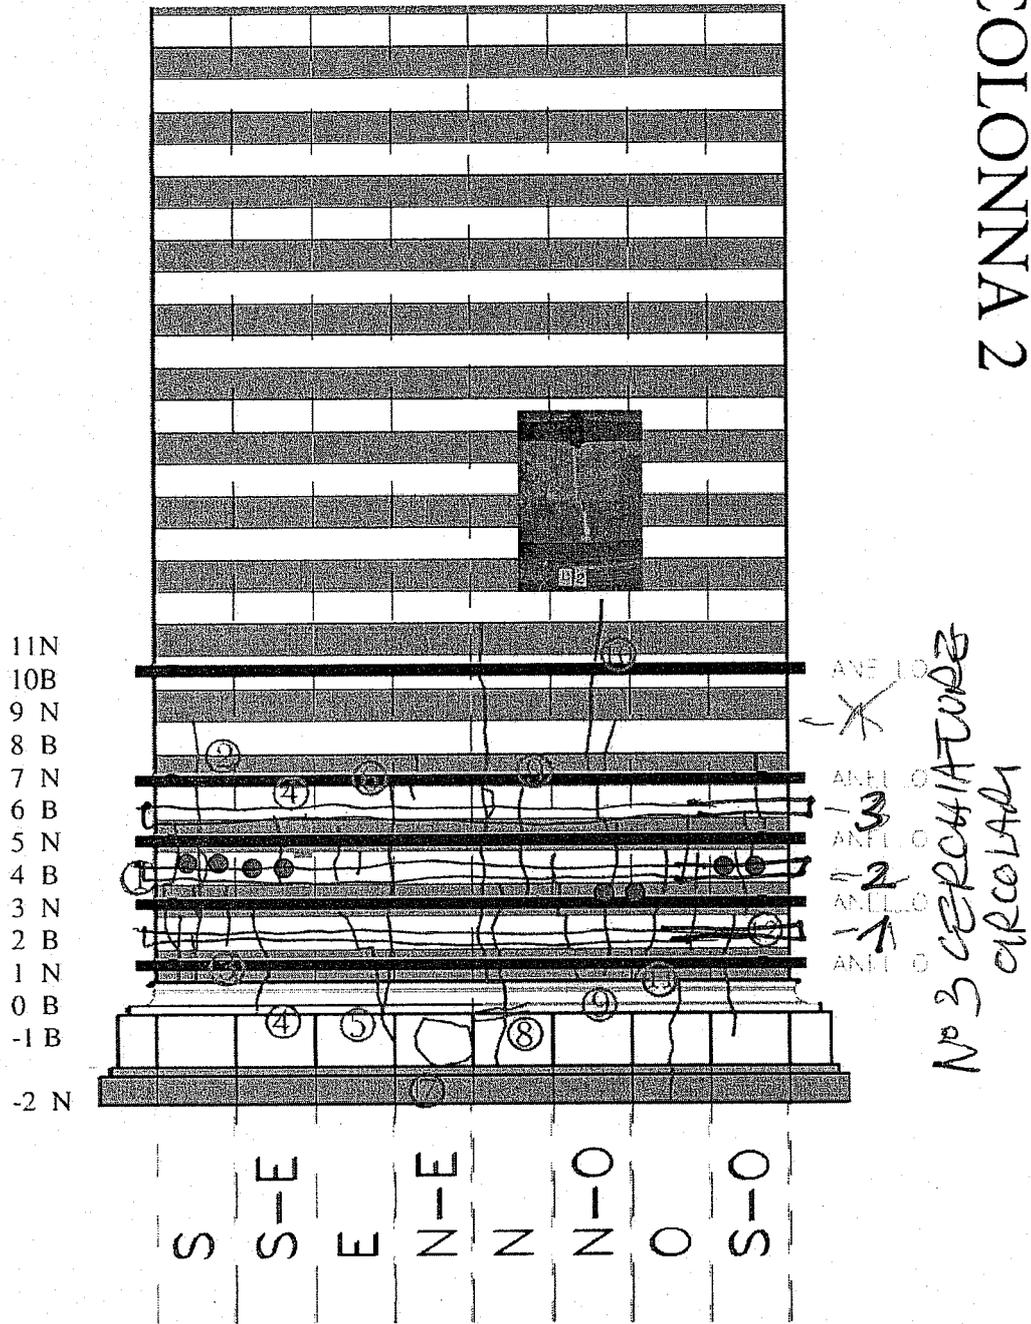


Rappresentazione piano mantello scala 1:50






COLONNA 8

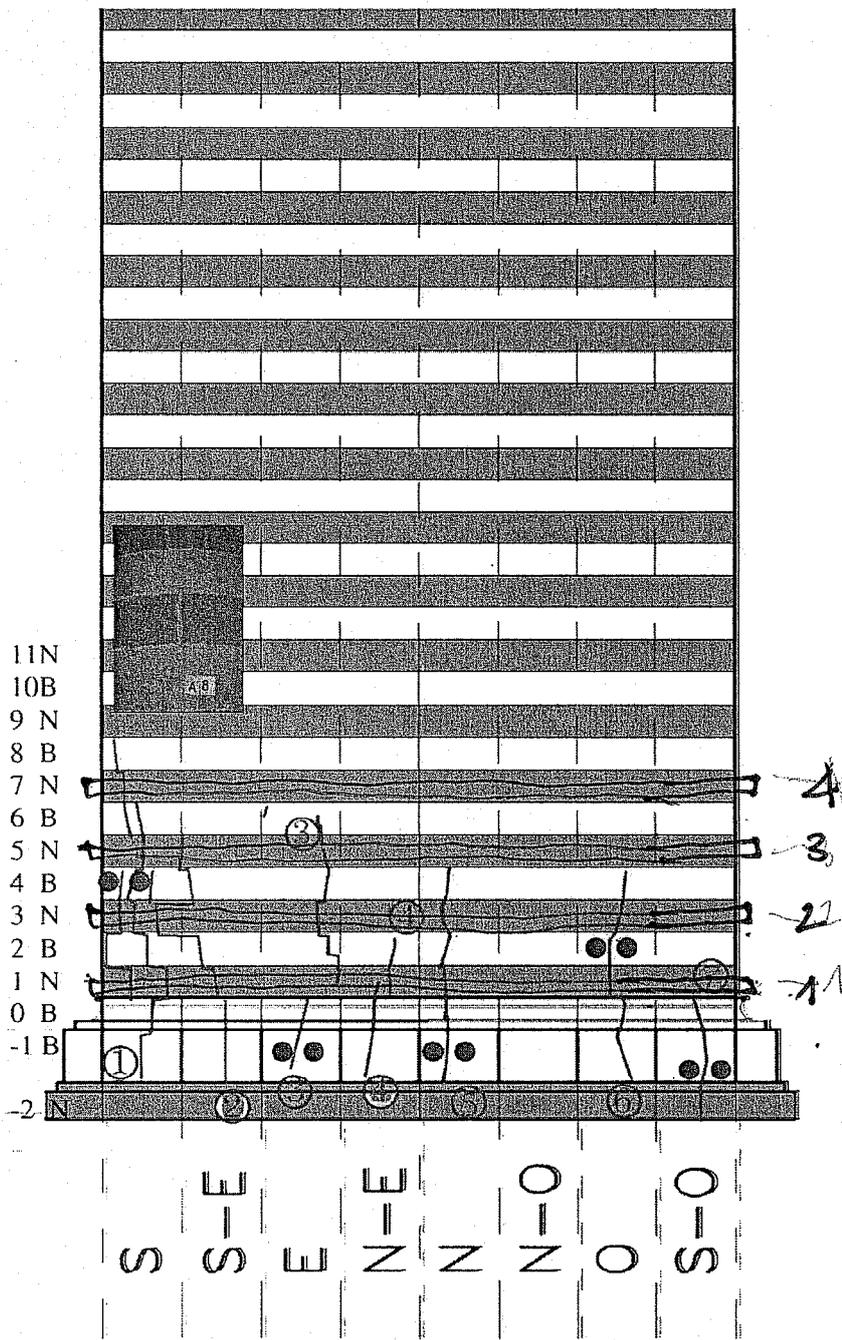

Rappresentazione piano mantello scala 1:50



COLONNA 9

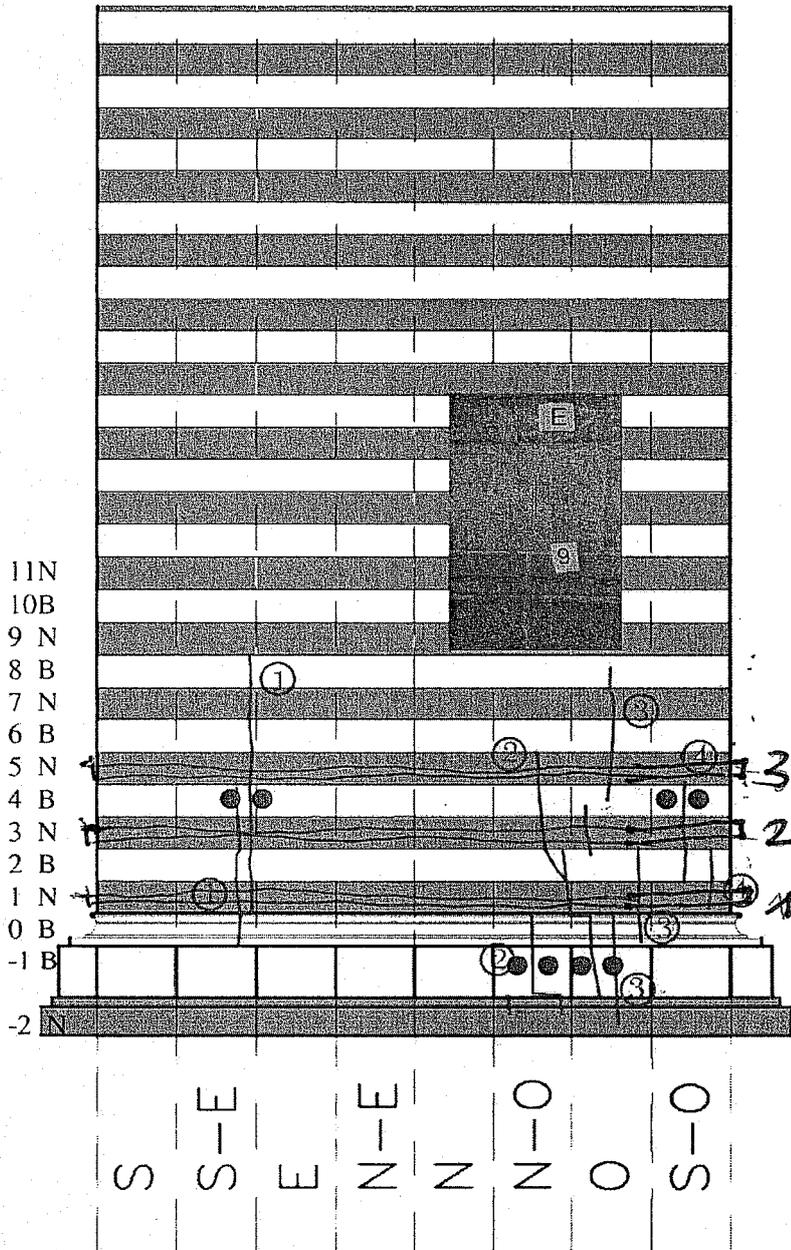


No 3 CERCHIATURE  
CIRCOLARI

Rappresentazione piana montello scala 1:50



# COLONNA 11

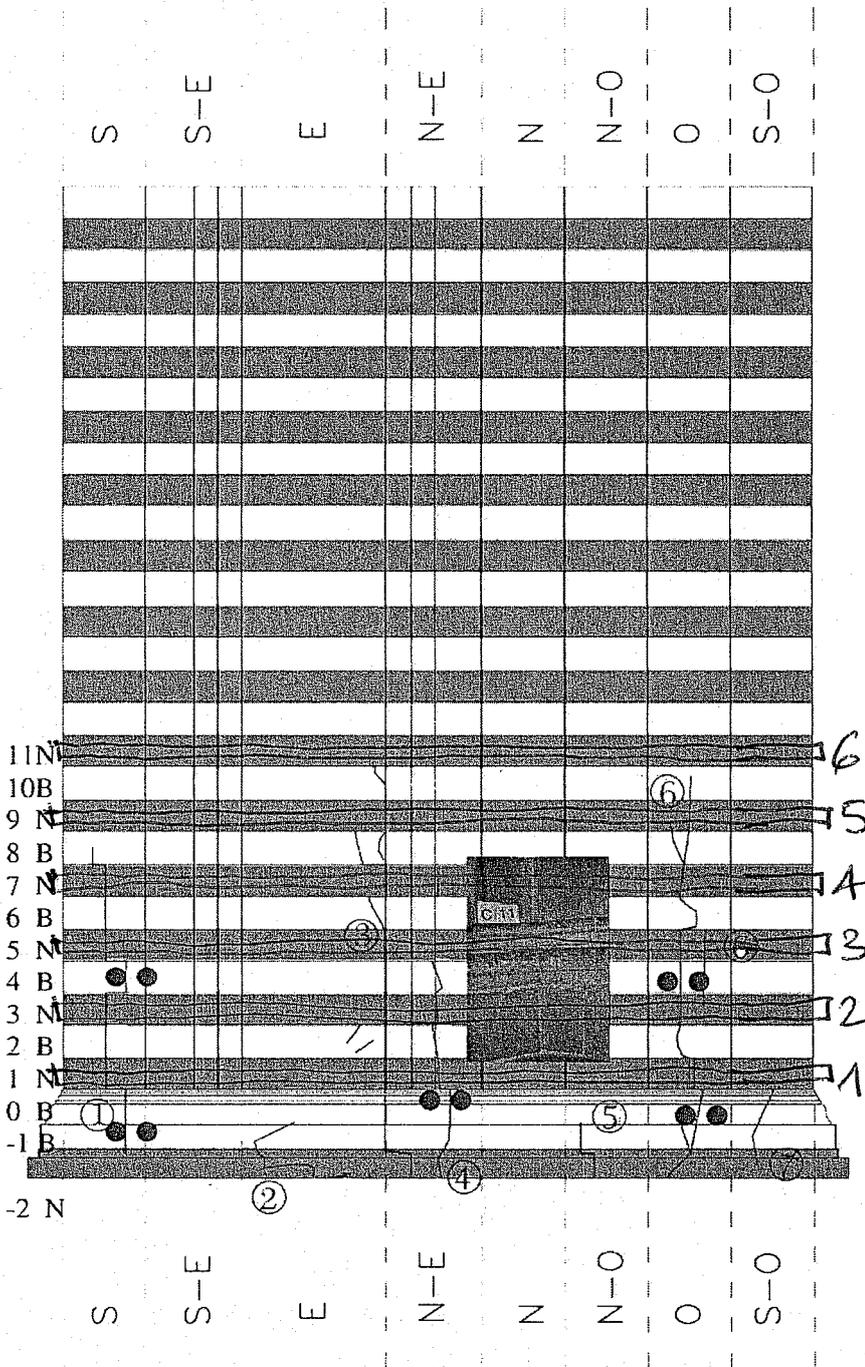

No 6 CERCHIATURE  
POLIGONALI

Scala 1:50





**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**  
Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria**

**PERIZIA N° 07/19 DEL 21/03/2019 di € 37.968,00**

**OGGETTO: ORVIETO (TR) - DUOMO -**

**LAVORI di RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' - INTERVENTO DI SOMMA  
URGENZA PER LA CERCHIATURA DEI PILASTRI DELLA NAVATA -**

Verbale di Somma Urgenza e di Consegna sotto riserva di legge del 15/03/2019

**IMPRESA:** Biritognolo Moreno con sede in Orvieto (TR), via dei Falegnami snc

**AVVISI AI CREDITORI**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Maurizio Damiani  
VISTI gli atti relativi ai lavori suddetti, in possesso dell'Ufficio;

**CERTIFICA**

che per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai Creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010.

Perugia, li 21/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Maurizio Damiani





**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
*Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le le Attività Culturali per l'Umbria*  
**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria**

**OGGETTO:** ORVIETO (TR) - DUOMO -

**LAVORI di RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA CERCHIATURA DEI PILASTRI DELLA NAVATA -**

**PERIZIA N° 07/19 DEL 21/03/2019 di € 37.968,00**

Verbale di Somma Urgenza e di Consegna sotto riserva di legge del 15/03/2019

**IMPRESA:** Biritognolo Moreno con sede in Orvieto (TR), via dei Falegnami snc

**DICHIARAZIONE SULLE CESSIONI DI CREDITO**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Maurizio Damiani  
visto il contratto relativo all'esecuzione dei lavori in epigrafe;  
visti gli atti in possesso di questo Ufficio,

**DICHIARA**

che, per quanto risulta dagli atti medesimi, l'Impresa suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

Perugia li 21/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maurizio Damiani

